



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

MATOS COSTA - SANTA CATARINA



ORDEM DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Matos Costa/SC, inscrita no CNPJ 83.102.566/0001-51 emite Ordem de Serviço para empresa **VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**, inscrita no CNPJ 31.320.555/0001-44, conforme Contrato nº 33/2019, celebrado entre as partes assinado dia 28 de novembro de 2019, tendo como objeto: Contratação de empresa para pavimentação com Lajotas Sextavadas de Concreto, drenagem pluvial, passeios e sinalização de Trechos das **Ruas Castro Alves, Olavo Ribas, José Antonio Carneiro - TR 01, José Antonio Carneiro - TR 02 e Luiz Schena**, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos aprovados pelo BADESC.

Prazo de Execução: 120 dias. Ressalva-se que o início da obra fica vinculado a aceitação da licitação apresentada pela Prefeitura, pelo corpo técnico do BADESC.

Matos Costa (SC), 02 de dezembro de 2019



Raul Ribas Neto
Prefeito Municipal

Ciente em 02/12/2019



**VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS
DE CIMENTO EIRELI**
CNPJ Nº 31.320.555/0001-44

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO

Matos Costa

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - EXTRATO CONTRATUAL Nº 33/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 83.102.568/0001-51. CONTRATADA: VILMAR RENNEN COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.320.555/0001-44. VALOR R\$: 896.373,95 (oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Vigência Contrato: INICIO: 28/11/2019 TÉRMINO: 28/11/2020.
Prazo Execução dos Serviços: 120 (cento e vinte) dias, após a assinatura da Ordem de Serviço.

Dotação: 4.4.90.51.99.00.00.00 (156)

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação com Lajotas Sextavadas de Concreto, drenagem pluvial, passeios e sinalização de Trechos das Ruas Castro Alves, Olavo Ribas, José Antonio Carneiro - TR 01, José Antonio Carneiro - TR 02 e Luiz Schena, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos aprovados pelo BADESC, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos. Matos Costa, 28 de novembro de 2019.

Raul Ribas Neto - Prefeito Municipal





[Ir para conteúdo](#) 1 [Ir para menu](#) 2 [Ir para busca](#) 3 [Ir para rodapé](#) 4 [Acessibilidade](#) 5 [Alto contraste](#) 6

Terça-Feira
Parcialmente
Nublado

↓ 11C
↑ 23C

Quarta-Feira
Pancadas de
Chuva

↓ 13C
↑ 24C



MUNICÍPIO DE
Matos Costa

[INÍCIO](#)

[MUNICÍPIO](#)

[GOVERNO](#)

[TRANSPARÊNCIA](#)

[NOTÍCIAS](#)

[CARTA DE SERVIÇOS](#)

[TURISMO](#)

[CONTATO](#)

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

Transparência

[Concursos Públicos](#)

[Contas Públicas e LRF](#)

[Legislação](#)

[Licitações](#)

BETHA AUTO
COTAÇÃO DOWNLOAD

[Relatorios de Gestao](#)

[Relatorio de Controle
Interno](#)

[PPA](#)

[LDO](#)

[LOA](#)

Licitações

Tomada de Preços N.º Processo Licitatório 44/2019

ENCERRADA - HOMOLOGADA

DATA DE ABERTURA: 19 / NOV / 2019

Valor Global: R\$1.121.631,33

Objeto: Contratação de empresa para pavimentação com Lajotas Sextavadas de Concreto, drenagem pluvial, passeios e sinalização de Trechos das Ruas Castro Alves, Olavo Ribas, José Antonio Carneiro - TR 01, José Antonio Carneiro - TR 02 e Luiz Schena, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos aprovados pelo BADESC, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Entidade: Prefeitura Municipal

Setor responsável: Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Convênios

PARECER DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS

Teste Seletivo

EDITAL E AVISOS

01/11/2019 - Aviso TP 07_2019 [0,1MB]

01/11/2019 - Edital TP 07_2019 LAJOTAS BADESC [0,4MB]

01/11/2019 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO RUA CASTRO ALVES A3 [0,0MB]

01/11/2019 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO RUA JOSE ANTONIO CARNEIRO A3 01 [0,0MB]

01/11/2019 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO RUA JOSE ANTONIO CARNEIRO A3 [0,0MB]

01/11/2019 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO RUA LUIZ SCHENA A3 [0,0MB]

01/11/2019 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO RUA OLAVO RIBAS A3 [0,0MB]

01/11/2019 - PLANILHA DE ORÇAMENTO RUA CASTRO ALVES [0,0MB]

01/11/2019 - PLANILHA DE ORÇAMENTO RUA JOSE ANTONIO CARNEIRO A2 [0,0MB]

01/11/2019 - PLANILHA DE ORÇAMENTO RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO [0,0MB]

01/11/2019 - PLANILHA DE ORÇAMENTO RUA LUIZ SCHENA [0,0MB]

01/11/2019 - PLANILHA DE ORÇAMENTO RUA OLAVO RIBAS [0,0MB]

01/11/2019 - MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO BADESC 2019 [0,8MB]

01/11/2019 - COMPOSIÇÃO BDI - BADESC [0,0MB]

04/11/2019 - manual_projetos_badesc_cidades [0,3MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 01 [0,7MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 02 [0,8MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 03 [0,3MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 04 [0,4MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 05 [0,3MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 06 [0,3MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 07 [0,9MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 08 [0,4MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 09 [0,5MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 10 [0,4MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 11 [0,5MB]

12/11/2019 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 12 [0,5MB]

28/11/2019 - PL 44_2019 TP 07_2019 Parte 01 [40,9MB]

28/11/2019 - PL 44_2019 TP 07_2019 Parte 02 [37,9MB]

28/11/2019 - PL 44_2019 TP 07_2019 Parte 03 [45,6MB]

28/11/2019 - PL 44_2019 TP 07_2019 Parte 04 [55,8MB]

29/11/2019 - Extrato Contrato 33_2019 [0,1MB]

29/11/2019 - PL 44_2019 TP 07_2019 Parte 05 [5,6MB]



HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

28/11/2019, situação alterada para Encerrada - Homologada

19/11/2019, situação alterada para Em andamento

04/11/2019, situação alterada para **Divulgado Aguardando Abertura****HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**De Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00
e das 13:30 às 17:30 horas

Ouvidoria@matoscosta.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE MATOS COSTARua Manoel Lourenço de Araújo, 137,
ouvidoria@matoscosta.sc.gov.br -

CEP: 89420-000

CNPJ: 83.102.566/0001-51

Telefones: (49) 3572-1111 (*Principal*)(49) 3572-1121 (*Principal*)

INÍCIO


MUNICÍPIOEX-PREFEITOS
AGENDA
HISTÓRICO
SIMBOLOS MUNICIPAIS
HINOS OFICIAS**GOVERNO**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

TRANSPARÊNCIACONCURSOS PÚBLICOS
CONTAS PÚBLICAS E LRF
LEGISLAÇÃO
LICITAÇÕES
RELATORIOS DE GESTAO
RELATORIO DE CONTROLE INTERNO
PPA
LDO
LOA
CONVÊNIOS
PARECER DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
TESTE SELETIVO

NOTÍCIAS

CARTA DE SERVIÇOS**TURISMO****CONTATO**



RNP: 2518419543
 Registro: 164059-2-SC
 Registro: C04609-6-SC

1. Responsável Técnico

BRUNO REGALIN

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE MATOS COSTA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Matos Costa
 Endereço: Rua Manoel Lourenço de Araújo
 Complemento:
 Cidade: MATOS COSTA
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 896.373,95
 Contrato: Celebrado em:

Honorários:
 Vinculado à ART:

Ação Institucional:
 Tipo de Contratante: Indefinido

Bairro: Centro
 UF: SC

CEP: 89420-000

CPF/CNPJ: 83.102.566/0001-51
 Nº: 137

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Matos Costa
 Endereço: Rua Olavo Ribas e outras
 Complemento:
 Cidade: MATOS COSTA
 Data de Início: 09/12/2019
 Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 09/04/2020

Coordenadas Geográficas:

Bairro: Centro
 UF: SC

CEP: 89420-000

CPF/CNPJ: 83.102.566/0001-51
 Nº: S/N

Código:

4. Atividade Técnica

Fiscalização

Sinalização Viária Vertical

Dimensão do Trabalho: 16,00 Unidade(s)

Fiscalização

Sinalização Viária Horizontal

Dimensão do Trabalho: 132,00 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Terraplenagem

Dimensão do Trabalho: 8.020,53 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Serviço topografico Planialtimétrico

Dimensão do Trabalho: 8.020,53 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Meio Fio

Dimensão do Trabalho: 1.748,16 Metro(s)

Fiscalização

Pavimentação em Lajotas

Dimensão do Trabalho: 8.020,53 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto

Orçamento

Dimensionamento

Compactação de aterro e/ou de base

Dimensão do Trabalho: 802,06 Metro(s) Cúbico(s)

Fiscalização

Passaio

Dimensão do Trabalho: 3.139,76 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Fiscalização das ruas Olavo Ribas, Castro Alves, Luís Schena, José Antônio Carneiro Trecho 1 e Trecho 2

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ABENG - 16

8. Informações

- . A ART é válida somente após o pagamento da taxa. Situação do pagamento da taxa da ART em 04/12/2019: TAXA DA ART A PAGAR
 Valor ART: R\$ 85,96 | Data Vencimento: 24/12/2019 | Registrada em: 04/12/2019
 Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14001904000482492
- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

MATOS COSTA - SC, 04 de Dezembro de 2019

BRUNO REGALIN

101.278.209-30

Contratante: Prefeitura Municipal de Matos Costa

83.102.566/0001-51





LEGENDA




RUAS A PAVIMENTAR

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS				
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA				
<p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borge Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretario Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Vieira - SC Fone 5660255</p>	<p>TITULO</p> <p>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS</p>		<p>PRANCHA</p> <p>01</p>	
	<p>REFERENCIA</p> <p>IMPLANTAÇÃO GERAL</p>			
	<p>PROPRIETARIO</p> <p>P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>		<p>ASSINATURA</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
	<p>RESPONSAVEL TECNICO</p> <p>RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0</p>		<p>ASSINATURA</p> <p>Ronaldo Regalin Engº Civil CREA 36714-0</p>	
<p>DESENHO</p> <p>R.R.</p>	<p>ESCALA</p> <p>1 / 2500</p>	<p>PREFEITURA</p> <p><i>[Signature]</i> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa/SC</p>		
	<p>DATA</p> <p>JULHO/2019</p>			

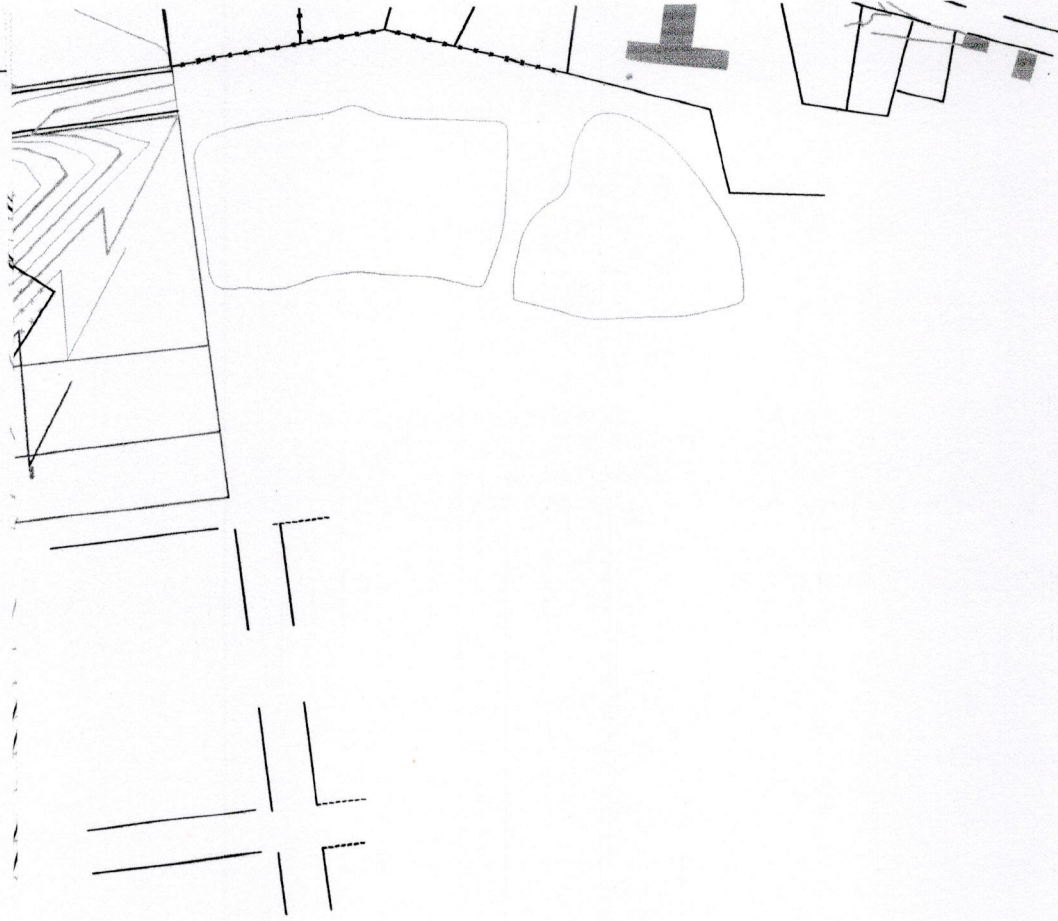


DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS			
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA			
 AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe Dorival Carlos Borga Presidente Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255	TITULO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS		PRANCHA <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">02</div>
	REFERENCIA ALTIMÉTRICO GERAL R.N.		
	PROPRIETARIO P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51		ASSINATURA <hr/>
	RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0		ASSINATURA <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;"> Ronaldo Regalin Engº Civil CREA 36714-0 </div>
	DESENHO R.R.	ESCALA 1 / 2500	PREFEITURA <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;"> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC </div>
		DATA JULHO/2019	

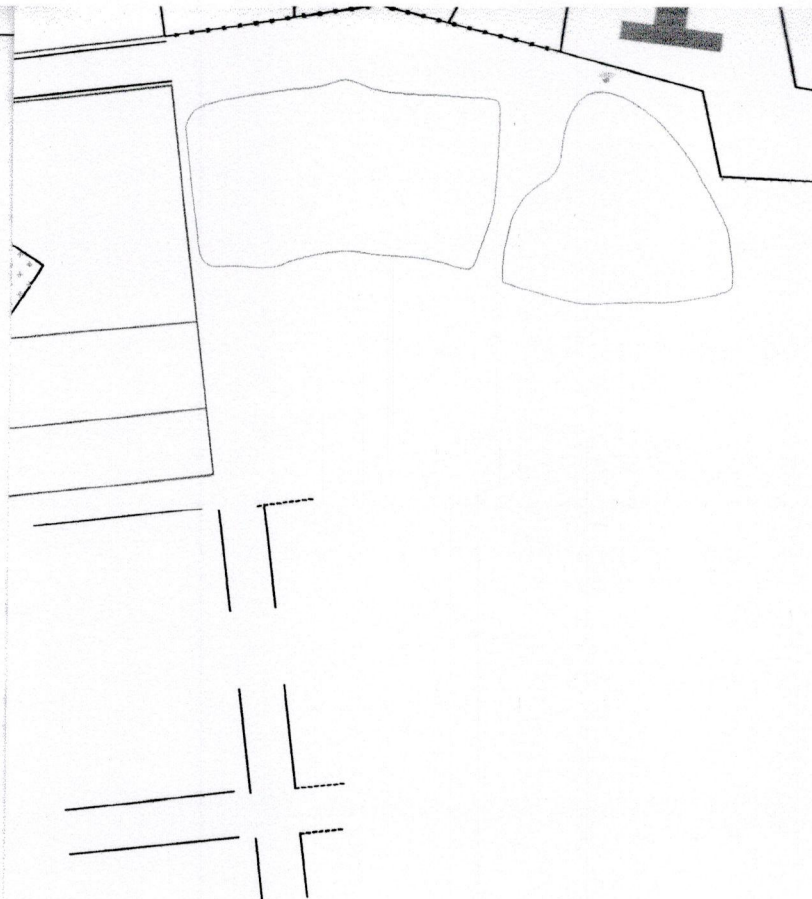


DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	<p>TITULO</p> <p>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS</p>	<p>PRANCHA</p> <p>03</p>
	<p>REFERENCIA</p> <p>ESTAQUEAMENTO GERAL SETOR 03</p>	
	<p>PROPRIETARIO</p> <p>P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>	<p>ASSINATURA</p>
	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0</p>	<p>ASSINATURA</p> <p><i>Ronaldo Regalin</i> Engº Civil CREA 36714-0</p>
<p>DESENHO</p> <p>R.R.</p>	<p>ESCALA</p> <p>1 / 2500</p> <p>DATA</p> <p>JULHO/2019</p>	<p>PREFEITURA</p> <p><i>Raul Ribas Neto</i> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC</p>






5X8

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS			
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA			
 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretario Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Vieira - SC Fone 5660255</p>	TITULO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS		PRANCHA 04
	REFERENCIA ESTAQUEAMENTO SETOR 03 SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO DETALHE		
	PROPRIETARIO P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51		ASSINATURA
	RESPONSAVEL TECNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0		ASSINATURA Ronaldo Regalin Eng. Civil CREA 36714-0
	DESENHO R.R.	ESCALA 1 / 2500	PREFEITURA RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC
	DATA JULHO/2019		

	1206
	1204
	1202
1208.02	
1208.296	
1208.28	
1208.279	

+4200+427.85

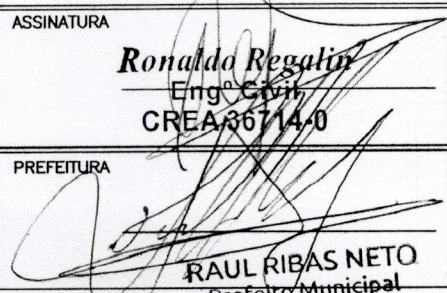



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS			
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA			
 AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe Dorival Carlos Borga Presidente Odivar Clóvis Biscaro Secretario Executivo Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255	TITULO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS		PRANCHA 05
	REFERENCIA PERFIL LONGITUDINAL		
	PROPRIETÁRIO P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51		ASSINATURA 
	RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0		ASSINATURA Ronaldo Regalin Eng.º Civil CREA 36714-0
DESENHO R.R.	ESCALA 1 / 2500	PREFEITURA  RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC	
	DATA JULHO/2019		



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS


ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

 AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe Dorival Carlos Borga Presidente Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255	TITULO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS		PRANCHA 06
	REFERENCIA PERFIL LONGITUDINAL		
	PROPRIETARIO P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51	ASSINATURA	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0	ASSINATURA <i>Ronaldo Regalin</i> CREA SC 36714-0	
DESENHO R.R.	ESCALA 1 / 2500	PREFEITURA	
	DATA JULHO/2019	RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC	

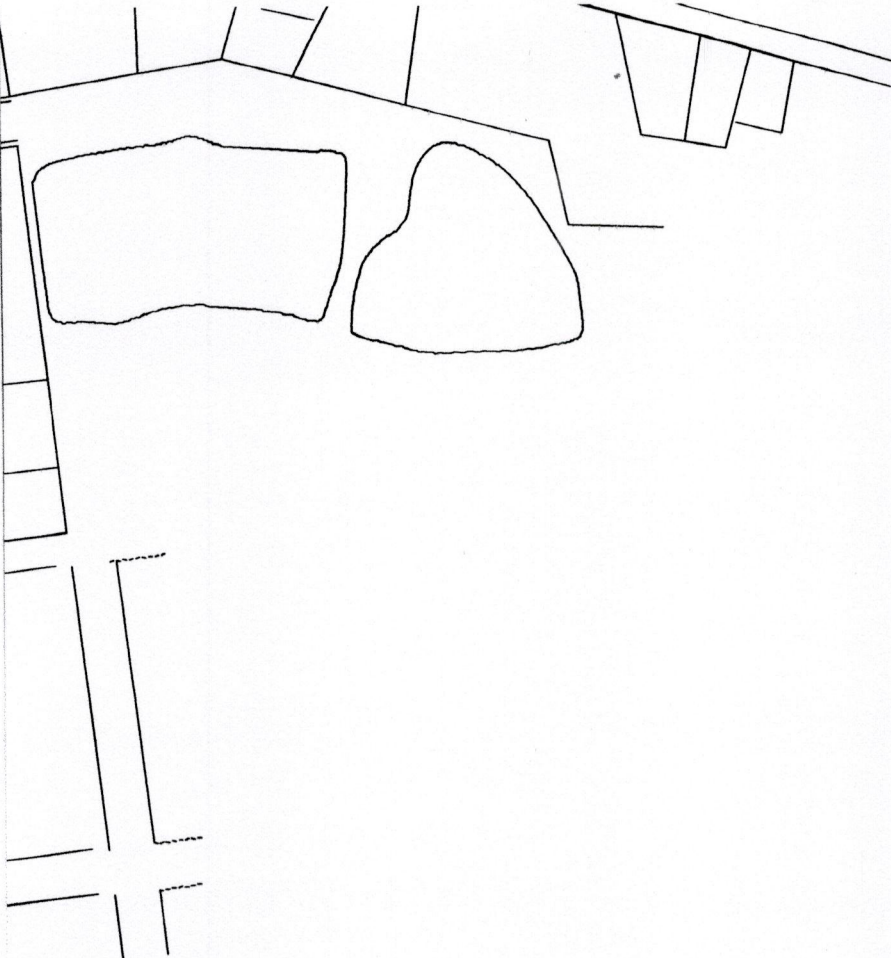

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	<p>TITULO</p> <p>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS</p>		<p>PRANCHA</p> <p>07</p>
	<p>REFERENCIA</p> <p>DRENAGEM GERAL SETOR 01; SETOR 02 SETOR 03</p>		
	<p>PROPRIETARIO</p> <p>P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>	<p>ASSINATURA</p>	
	<p>RESPONSAVEL TECNICO</p> <p>RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0</p>	<p>ASSINATURA</p> <p><i>Ronaldo Regalin</i> Engº Civil CREA 36714-0</p>	
<p>DESENHO</p> <p>R.R.</p>	<p>ESCALA</p> <p>1 / 2500</p>	<p>PREFEITURA</p> <p><i>Raul Ribas Neto</i> R. RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC</p>	
	<p>DATA</p> <p>JULHO/2019</p>		

SEGUIE EM VALA ABERTA



DA/ ORÇAMENTO RO ALVES

FLUXO NAO COTADO i = 2% (min)


OBO A IMPLANTAR - 08 Un

EXISTENTE

A IMPLANTAR

∅ 30	-	29,24m
∅ 40	-	128,51m
∅ 60	-	53,94m
JLAÇÃO	-	211,69m

JLAÇÃO NÃO COTADA ∅ 30

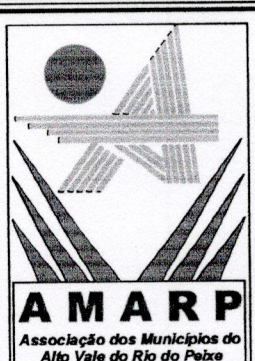DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS			
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA			
 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borge Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretario Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Vieira - SC Fone 5660255</p>	<p>TITULO</p> <p style="text-align: center; font-size: large;">PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS</p>	<p>PRANCHA</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em;">08</div>	
	<p>REFERENCIA</p> <p>DRENAGEM SETOR 03 DETALHE BOCA DE LOBO LEGENDA/ORÇAMENTO</p>		
	<p>PROPRIETÁRIO</p> <p style="text-align: center; font-size: large;">P. M. MATOS COSTA</p> <p>CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>	<p>ASSINATURA</p>	
	<p>RESPONSAVEL TECNICO</p> <p style="text-align: center; font-size: large;">RONALDO REGALIN</p> <p>CREA SC 36714-0</p>	<p>ASSINATURA</p> <p style="text-align: center; font-size: large;">Ronaldo Regalin</p> <p style="text-align: center;">Engº Civil</p> <p style="text-align: center;">CREA 36714-0</p>	
<p>DESENHO</p> <p style="text-align: center; font-size: large;">R.R.</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center; font-size: large;">1 / 2500</p>	<p>PREFEITURA</p>	
<p>DATA</p> <p style="text-align: center; font-size: large;">JULHO/2019</p>		<p style="text-align: center; font-size: large;">RAUL RIBAS NETO</p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal</p> <p style="text-align: center;">Matos Costa - SC</p>	

PARADA OBRIGATÓRIA – PADRÃO R1

LADO MINIMO 0,25m

ORLA INF. BRANCA MIN. 0,020m

ORLA EXT. VERM. MIN. 0,010m



VELOCIDADE – PADRÃO R19

DIAMETRO MINIMO 0,40m


TARJA MINIMA 0,040m

ORLA MINIMA 0,040m

PLACA METÁLICA NOMINATIVA DAS RUAS
0,20m X 0,40m

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretario Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira – SC Fone 5660255</p>	TITULO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS		PRANCHA 09
	REFERENCIA SINALIZAÇÃO SETOR 03 ESTATISTICA		
	PROPRIETARIO P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51	ASSINATURA	
	RESPONSAVEL TECNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0	ASSINATURA <i>Ronaldo Regalin</i> Engº Civil CREA 36714-0	
	DESENHO R.R.	ESCALA 1 / 2500	PREFEITURA <i>Raul Ribas Neto</i> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC
	DATA JULHO/2019		



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

 AMARP Associação dos Municípios do Vale do Rio do Peixe Ival Carlos Borga Presidente Clóvis Biscaro Secretário Executivo Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255	TITULO		PRANCHA
	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS		10
	REFERENCIA		
	SINALIZAÇÃO DE RUAS A PAVIMENTAR DETALHAMENTO		
	PROPRIETARIO	ASSINATURA	
P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51			
RESPONSAVEL TECNICO	ASSINATURA		
RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0	<i>Ronaldo Regalin</i> Engº Civil CREA 36714-0		
DESENHO	ESCALA	PREFEITURA	
R.R.	1 / 2500	<i>Raul Ribas Neto</i> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC	
	DATA JULHO/2019		

PASSEIOS	1,75m
MEIO FIO	41,90m
AREA A PAVIMENTAR	73,32m ²
RAMPA DE ACESSO	02




TOTAL	
AREA A PAVIMENTAR	3.139,76m ²
EXTENSÃO TOTAL	1.748,16m

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA


 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretario Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	<p>TITULO</p> <p>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS</p>		<p>PRANCHA</p> <p>1 1</p>
	<p>REFERENCIA</p> <p>PASSEIOS SETOR 03 DETALHES</p>		
	<p>PROPRIETARIO</p> <p>P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>		<p>ASSINATURA</p>
	<p>RESPONSAVEL TECNICO</p> <p>RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0</p>		<p>ASSINATURA</p> <p><i>Ronaldo Regalin</i> Eng. Civil CREA 36714-0</p>
<p>DESENHO</p> <p>R.R.</p>	<p>ESCALA</p> <p>1 / 2500</p>	<p>PREFEITURA</p> <p><i>Raul Ribas Neto</i> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC</p>	
	<p>DATA</p> <p>JULHO/2019</p>		

A DE RAMPA

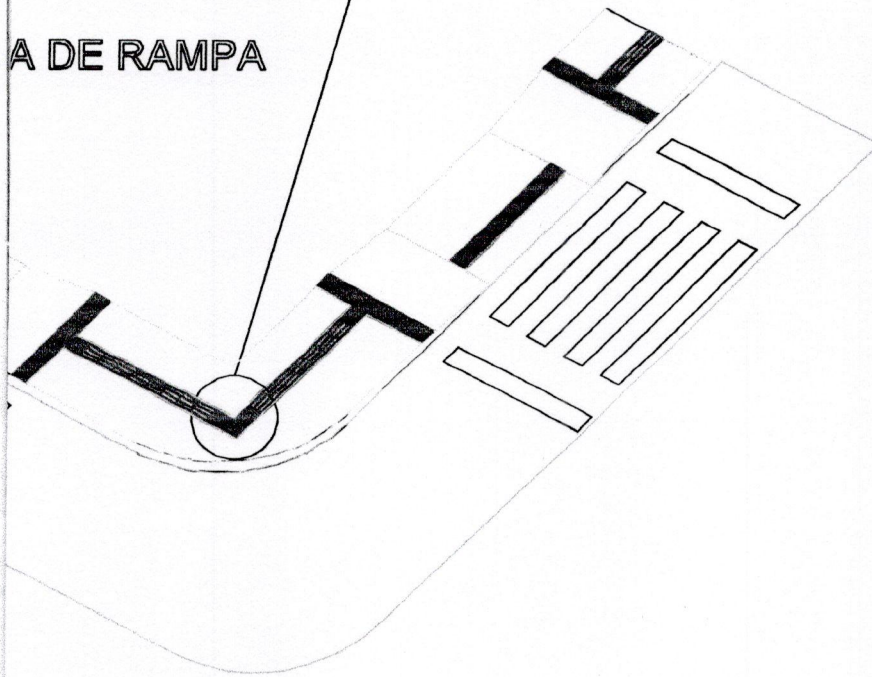

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borge Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretario Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	TITULO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS		PRANCHA 12
	REFERENCIA PASSEIOS DE RUAS A PAVIMENTAR PASSEIOS ACESSIVEIS DETALHAMENTO		
	PROPRIETARIO P. M. MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51	ASSINATURA	
	RESPONSAVEL TECNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0	ASSINATURA Ronaldo Regalin Eng. Civil CREA 36714-0	
	DESENHO R.R.	ESCALA 1 / 2500	PREFEITURA RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC
	DATA JULHO/2019		

19/12/2019

Webmail Fecam :: NECESSITA DE AJUSTES NA LICITAÇÃO

Assunto **NECESSITA DE AJUSTES NA LICITAÇÃO**



De <gerom@badesc.gov.br>

Para <projetos@matoscosta.sc.gov.br>, <projetos@matoscosta.sc.gov.br>

Data 2019-12-19 15:51



Prezados colaboradores da Pref. Munic. de MATOS COSTA,

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que a **licitação** do projeto 40 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA CASTRO ALVES necessita de **AJUSTES** para ser aprovada pelo BADESC.

Seguem abaixo as observações dos técnicos do BADESC:

Os preços unitários e totais dos serviços que compõem a obra estão de acordo com o orçamento e tabelas referenciais de mercado. Entretanto considerando como parte de um mesmo lote de licitação os preços unitários dos mesmos serviços devem ser iguais entre si. Dessa forma, os seguintes serviços estão com preços unitários incompatíveis: - reaterro de vala; - boca de lobo; - bloco sextavado; - meio-fio; - passeio em piso intertravado; - pintura acrílica p/ sinalização horizontal; Assim, solicitamos que os preços destes serviços sejam homogeneizados, adotando o menor valor apresentado como o adequado, conforme projeto n. 37!

Solicitamos que a licitação seja submetida novamente para análise tão logo os ajustes pedidos tenham sido realizados.

Sem mais, aproveitamos para renovar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Gerência de Operações Municipais (GEROM) do BADESC

E-mail automático.
Favor não responder.

Rua Almirante Alvim, 491
CP: 1521 - CEP: 88015-380
Florianópolis - SC

Fone: (48) 3216 5000
FAX: (48) 3216 5007
Ouvidoria: 0800 644 1212

GEROM - Gerência de Operações Municipais
Fone: (48) 3216 5000

Assunto NECESSITA DE AJUSTES NA LICITAÇÃO**De** <gerom@badesc.gov.br>**Para** <projetos@matoscosta.sc.gov.br>, <projetos@matoscosta.sc.gov.br>**Data** 2019-12-19 15:53

Prezados colaboradores da Pref. Munic. de MATOS COSTA,

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que a **licitação** do projeto 41 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA LUIZ SCHENA necessita de **AJUSTES** para ser aprovada pelo BADESC.

Seguem abaixo as observações dos técnicos do BADESC:

Os preços unitários e totais dos serviços que compõem a obra estão de acordo com o orçamento e tabelas referenciais de mercado. Entretanto considerando como parte de um mesmo lote de licitação os preços unitários dos mesmos serviços devem ser iguais entre si. Dessa forma, os seguintes serviços estão com preços unitários incompatíveis: - reaterro de vala; - boca de lobo; - bloco sextavado; - meio-fio; - passeio em piso intertravado; - pintura acrílica p/ sinalização horizontal; Assim, solicitamos que os preços destes serviços sejam homogeneizados, adotando o menor valor apresentado como o adequado, conforme projeto n. 37!

Solicitamos que a licitação seja submetida novamente para análise tão logo os ajustes pedidos tenham sido realizados.

Sem mais, aproveitamos para renovar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Gerência de Operações Municipais (GEROM) do BADESC

E-mail automático.
Favor não responder.

Rua Almirante Alvim, 491
CP: 1521 - CEP: 88015-380
Florianópolis - SC

Fone: (48) 3216 5000
FAX: (48) 3216 5007
Ouvidoria: 0800 644 1212

GEROM - Gerência de Operações Municipais
Fone: (48) 3216 5000

Assunto NECESSITA DE AJUSTES NA LICITAÇÃO**De** <gerom@badesc.gov.br>**Para** <projetos@matoscosta.sc.gov.br>, <projetos@matoscosta.sc.gov.br>**Data** 2019-12-19 15:50

Prezados colaboradores da Pref. Munic. de MATOS COSTA,

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que a licitação do projeto 39 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO TR 01 necessita de AJUSTES para ser aprovada pelo BADESC.

Seguem abaixo as observações dos técnicos do BADESC:

Os preços unitários e totais dos serviços que compõem a obra estão de acordo com o orçamento e tabelas referenciais de mercado. Entretanto considerando como parte de um mesmo lote de licitação os preços unitários dos mesmos serviços devem ser iguais entre si. Dessa forma, os seguintes serviços estão com preços unitários incompatíveis: - reaterro de vala; - boca de lobo; - bloco sextavado; - meio-fio; - passeio em piso intertravado; - pintura acrílica p/ sinalização horizontal; Assim, solicitamos que os preços destes serviços sejam homogeneizados, adotando o menor valor apresentado como o adequado, conforme projeto n. 371

Solicitamos que a licitação seja submetida novamente para análise tão logo os ajustes pedidos tenham sido realizados.

Sem mais, aproveitamos para renovar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Gerência de Operações Municipais (GEROM) do BADESC

E-mail automático.
Favor não responder.

Rua Almirante Alvim, 491
CP: 1521 - CEP: 88015-380
Florianópolis - SC

Fone: (48) 3216 5000
FAX: (48) 3216 5007
Ouvidoria: 0800 644 1212

GEROM - Gerência de Operações Municipais
Fone: (48) 3216 5000

Assunto NECESSITA DE AJUSTES NA LICITAÇÃO**De** <gerom@badesc.gov.br>**Para** <projetos@matoscosta.sc.gov.br>, <projetos@matoscosta.sc.gov.br>**Data** 2019-12-19 15:47

Prezados colaboradores da Pref. Munic. de MATOS COSTA,

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que a **licitação** do projeto 38 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO TR 02 necessita de **AJUSTES** para ser aprovada pelo BADESC.

Seguem abaixo as observações dos técnicos do BADESC:

Os preços unitários e totais dos serviços que compõem a obra estão de acordo com o orçamento e tabelas referenciais de mercado. Entretanto considerando como parte de um mesmo lote de licitação os preços unitários dos mesmos serviços devem ser iguais entre si. Dessa forma, os seguintes serviços estão com preços unitários incompatíveis: - bloco sextavado; - meio-fio; - passeio em piso intertravado; - pintura acrílica p/ sinalização horizontal; Assim, solicitamos que os preços destes serviços sejam homogeneizados, adotando o menor valor apresentado como o adequado, conforme projeto n. 37!

Solicitamos que a licitação seja submetida novamente para análise tão logo os ajustes pedidos tenham sido realizados.

Sem mais, aproveitamos para renovar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Gerência de Operações Municipais (GEROM) do BADESC

E-mail automático.
Favor não responder.

Rua Almirante Alvim, 491
CP: 1521 - CEP: 88015-380
Florianópolis - SC

Fone: (48) 3216 5000
FAX: (48) 3216 5007
Ouvidoria: 0800 644 1212

GEROM - Gerência de Operações Municipais
Fone: (48) 3216 5000

19/12/2019

Webmail Fecam :: NECESSITA DE AJUSTES NA LICITAÇÃO

Assunto **NECESSITA DE AJUSTES NA LICITAÇÃO**

De <gerom@badesc.gov.br>

Para <projetos@matoscosta.sc.gov.br>, <projetos@matoscosta.sc.gov.br>

Data 2019-12-19 17:20



Prezados colaboradores da Pref. Munic. de MATOS COSTA,

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que a **licitação** do projeto 37 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA OLAVO RIBAS necessita de **AJUSTES** para ser aprovada pelo BADESC.

Seguem abaixo as observações dos técnicos do BADESC:

A data de abertura é posterior à data de julgamento. Favor corrigir.

Solicitamos que a licitação seja submetida novamente para análise tão logo os ajustes pedidos tenham sido realizados.

Sem mais, aproveitamos para renovar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Gerência de Operações Municipais (GEROM) do BADESC

E-mail automático.
Favor não responder.

Rua Almirante Alvim, 491
CP: 1521 - CEP: 88015-380
Florianópolis - SC

Fone: (48) 3216 5000
FAX: (48) 3216 5007
Ouvidoria: 0800 644 1212

GEROM - Gerência de Operações Municipais
Fone: (48) 3216 5000



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**



NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137, Centro, Matos Costa, SC, inscrito no CNPJ 83.102.566/0001-51, neste ato representada pela Secretária de administração Sr^a. **CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI**

NOTIFICADA: VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.320.555/0001-44, com sede na cidade de General Carneiro, PR, neste ato representada pela Sr. **VILMAR PEDRO RENNER**, brasileiro, empresário, inscrita no CPF sob nº 023.706.609-29, residente e domiciliada na cidade de General Carneiro, PR.

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: PREÇOS UNITÁRIOS INCOMPATÍVEIS APRESENTADO NAS PLANILHAS - PROPOSTA DE PREÇOS - Processo Licitatório nº 44/2019 - Tomada de Preço nº 07/2019.

Senhor Representante,

Em virtude dos apontamentos efetuados pelo BADESC referente a divergência na Proposta de Preço em relação aos valores unitários,

"[...] considerando como parte de um mesmo lote de licitação os preços unitários dos mesmos serviços devem ser iguais entre si. Dessa forma, os seguintes serviços estão com preços unitários incompatíveis:

- * Bloco sextavado;
- * Meio fio;
- * Passeio em piso intertravado;
- * Pintura acrílica para sinalização horizontal;
- * Re-aterro de vala;
- * Boca de lobo;"

Fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** para, no prazo improrrogável de até 48 horas, efetuar a retificação da Proposta de Preços apresentada na data de 19/11/2019, findo qual, o município tomará as providências conforme legislação aplicada, podendo ensejar a rescisão contratual e/ou a convocação do próximo licitante.

Observamos que os preços destes serviços devem ser homogêneos, adotando o menor valor apresentado como adequado.

Matos Costa, SC, 14 de janeiro de 2020.


CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Administração

VILM. RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n.º 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL


OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua Luiz Schena

LOCAL: Matos Costa - SC

TOMADA DE PREÇOS 007/2019

BDI...: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.655,64	0,39	645,70
2 DRENAGEM					
	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	277,53	8,28	2.297,95
2.1		M	136,67	57,60	7.872,19
2.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,86	86,41	12.171,71
2.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	222,02	9,00	1.998,18
2.4					
2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA CONCRETO	UNID	14	800,00	11.200,00
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.655,64	1,49	2.466,90
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	165,56	100,00	16.556,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM	M2	1.655,64	47,85	79.222,37
4 PASSEIOS					
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	433,04	33,00	14.290,32
4.1					
4.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	801,12	3,00	2.403,36
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	801,12	50,00	40.056,00
4.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO	UNID	6,00	290,00	1.740,00
4.4	ALERTA/DIRECIONAL DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E= 5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)				
5 SINALIZAÇÃO					
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	1,00	366,70	366,70
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00	293,46	586,92


 José Cláudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3




VILM. R. RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

		UNID			
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M2	36,00	9,00	324,00
5.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO				2.075,00
6	ADM LOCAL DA OBRA				2.075,00
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	20,75	2.075,00
TOTAL					197.801,20

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020


 José Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3





VILN RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL

OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua Castro Alves

LOCAL: Matos Costa - SC

TOMADA DE PREÇOS 007/2019

BDI...: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.567,87
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.021,25	0,39	398,29
2	DRENAGEM				32.029,26
	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	213,86	8,28	1.770,76
2.1		M	29,24	57,60	1.684,22
2.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,68	86,41	11.292,06
2.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	53,94	173,20	9.342,41
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	171,09	9,00	1.539,81
2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACICO, REVESTIDA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA CONCRETO	UNID	8	800,00	6.400,00
3	PAVIMENTAÇÃO				60.601,48
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.021,25	1,49	1.521,66
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	102,13	100,00	10.213,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	1.021,25	47,85	48.866,81
4	PASSEIOS				33.562,32
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	247,26	33,00	8.159,58
4.1		M2	457,41	3,00	1.372,23
4.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2			
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 40 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	457,41	50,00	22.870,50
4.3					
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E=5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO	UNID	4,00	290,00	1.160,00
4.4	ALERTA/DIRECIONAL DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E=5 CM, ÁREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)				
5	SINALIZAÇÃO				1.527,93
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	1,00	366,70	366,70
5.1					



José Cláudio Maciel
Engenheiro Civil
CREA-PR Nº 155657/D
CREA-SC Nº 145805-3

VILIR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00	293,46	586,92
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	1,00	358,31	358,31
5.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	24,00	9,00	216,00
6	ADM LOCAL DA OBRA				1.242,00
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	12,42	1.242,00
TOTAL					130.530,85

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020

José Cláudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL

TOMADA DE PREÇOS 007/2019


OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua José Antonio Carneiro TR 01

LOCAL: Matos Costa - SC

BDI...: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.360,93
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	490,64	0,39	191,35
2	DRENAGEM				16.786,09
	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	90,85	8,28	752,24
2.1	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,50	57,60	316,80
2.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,92	86,41	1.894,11
2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	57,79	173,20	10.009,23
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	68,19	9,00	613,71
2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA CONCRETO	UNID	4	800,00	3.200,00
3	PAVIMENTAÇÃO				29.114,18
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	490,64	1,49	731,05
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	49,06	100,00	4.906,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	490,64	47,85	23.477,12
4	PASSEIOS				22.627,66
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,26	33,00	6.608,58
4.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	280,36	3,00	841,08
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	280,36	50,00	14.018,00
4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO	UNID	4,00	290,00	1.160,00
4.4	ALERTA/DIRECIONAL DE COLCHÃO DE PÓ-DE PEDRA E= 5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)				2.977,95
5	SINALIZAÇÃO				
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MÃO ESTRUTURAL	UNID	3,00	366,70	1.100,10




 José Cláudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3

VILN X RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00	293,46	586,92
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	3,00	358,31	1.074,93
5.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	24,00	9,00	216,00
6	ADM LOCAL DA OBRA				820,00
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	8,20	820,00
TOTAL					73.686,81

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020

José Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3



VIL R RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE C ENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL

OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua José Antonio Carneiro TR 02

LOCAL: Matos Costa - SC


TOMADA DE PREÇOS 007/2019

BDI...: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	146,65	0,39	57,19
2 PAVIMENTAÇÃO					
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	146,65	1,49	218,51
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	14,67	100,00	1.467,00
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	146,65	47,85	7.017,20
3 PASSEIOS					
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	41,90	33,00	1.382,70
3.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	73,32	3,00	219,96
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL (C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_ 12/2015	M2	73,32	50,00	3.666,00
3.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO	UNID	2,00	290,00	580,00
4 SINALIZAÇÃO					
4.1	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	12,00	9,00	108,00
5 ADM LOCAL DA OBRA					
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	3,57	357,00
TOTAL					16.243,15

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020

José Claudio Maciel
Engenheiro Civil
CREA-PR Nº 155657/D
CREA-SC Nº 145805-3



VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, nº 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL


OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua Olavo Ribas

TOMADA DE PREÇOS 007/2019

LOCAL: Matos Costa - SC

BDI....: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.005,06
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.706,35	0,39	1.835,48
2	DRENAGEM				69.028,45
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARTE E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP) FROTA DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	470,35	8,28	3.894,50
2.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,42	57,60	4.056,19
2.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	327,16	86,41	28.269,90
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLOUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	18,82	173,20	3.259,62
2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLOUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	53,95	232,84	12.561,72
2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	376,28	9,00	3.386,52
2.7	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA CONCRETO	UNID	17,00	800,00	13.600,00
3	PAVIMENTAÇÃO				279.134,12
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.706,35	1,49	7.012,46
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	470,64	100,00	47.064,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	4.706,35	47,82	225.057,66
4	PASSEIOS				109.948,25
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	825,70	33,00	27.248,10
4.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.527,55	3,00	4.582,65
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	1.527,55	50,00	76.377,50
4.4	RAMPA DE ACCESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E= 5 CM, ÁREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)	UNID	6,00	290,00	1.740,00


 José Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3



VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44


RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

5	SINALIZAÇÃO					1.627,54
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D= 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00		293,46	586,92
5.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00		358,31	716,62
5.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	36,00		9,00	324,00
5.3	ADM LOCAL DA OBRA					5.380,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00		53,80	5.380,00
TOTAL						468.123,41

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020

José Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3





NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137, Centro, Matos Costa, SC, inscrito no CNPJ 83.102.566/0001-51, neste ato representada pela Secretária de administração Sr^a. **CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI**

NOTIFICADA: VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.320.555/0001-44, com sede na cidade de General Carneiro, PR, neste ato representada pela Sr. **VILMAR PEDRO RENNER**, brasileiro, empresário, inscrita no CPF sob nº 023.706.609-29, residente e domiciliada na cidade de General Carneiro, PR.

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: PREÇOS UNITÁRIOS INCOMPATÍVEIS APRESENTADO NAS PLANILHAS - PROPOSTA DE PREÇOS - Processo Licitatório nº 44/2019 - Tomada de Preço nº 07/2019.

Senhor Representante,

Em virtude dos apontamentos efetuados pelo BADESC referente a divergência na Proposta de Preço em relação aos valores unitários,

"[...] considerando como parte de um mesmo lote de licitação os preços unitários dos mesmos serviços devem ser iguais entre si. Dessa forma, os seguintes serviços estão com preços unitários incompatíveis:

* BLOCO SEXTAVADO;

Fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** para, no prazo improrrogável de até 48 horas, efetuar a retificação das Planilhas Orçamentárias apresentadas na data de 15/01/2020, findo qual, o município tomará as providências conforme legislação aplicada, podendo ensejar a rescisão contratual e/ou a convocação do próximo licitante.

Observamos que os preços destes serviços devem ser homogeneizados, adotando o menor valor apresentado como adequado.

Matos Costa, SC, 15 de janeiro de 2020.


CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Administração

VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL

OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua Olavo Ribas

LOCAL: Matos Costa - SC

TOMADA DE PREÇOS 007/2019

BDI...: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.706,35	0,39	1.835,48
2 DRENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARTE E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP) FROTA DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF.12/2013	M3	470,35	8,28	3.894,50
2.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,42	57,60	4.056,19
2.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	327,16	86,41	28.269,90
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	18,82	173,20	3.259,62
2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	53,95	232,84	12.561,72
2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	376,28	9,00	3.386,52
2.7	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA CONCRETO	UNID	17,00	800,00	13.600,00
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.706,35	1,49	7.012,46
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	470,64	100,00	47.064,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	4.706,35	47,82	225.057,66
4 PASSEIOS					
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	825,70	33,00	27.248,10
4.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.527,55	3,00	4.582,65
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	1.527,55	50,00	76.377,50
4.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E= 5 CM, ÁREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)	UNID	6,00	290,00	1.740,00

José Cláudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3




VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

5	SINALIZAÇÃO					1.627,54
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D= 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00	293,46		586,92
5.1						
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00	358,31		716,62
5.2						
	5.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	36,00	9,00		324,00
6	ADM LOCAL DA OBRA					5.380,00
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	53,80		5.380,00
TOTAL						468.123,41

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020


 José Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3





VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL


OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua Castro Alves

LOCAL: Matos Costa - SC

TOMADA DE PREÇOS 007/2019

BDI....: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.567,87
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.021,25	0,39	398,29
2	DRENAGEM				32.029,26
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP). FROTA DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	213,86	8,28	1.770,76
2.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,24	57,60	1.684,22
2.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,68	86,41	11.292,06
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	53,94	173,20	9.342,41
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	171,09	9,00	1.539,81
2.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA CONCRETO	UNID	8	800,00	6.400,00
3	PAVIMENTAÇÃO				60.570,84
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.021,25	1,49	1.521,66
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	102,13	100,00	10.213,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	1.021,25	47,82	48.836,18
4	PASSEIOS				33.562,32
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	247,26	33,00	8.159,58
4.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	457,41	3,00	1.372,23
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	457,41	50,00	22.870,50
4.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO	UNID	4,00	290,00	1.160,00
4.4	ALERTA/DIRECIONAL DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E= 5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)	UNID	4,00	290,00	1.160,00
5	SINALIZAÇÃO				1.527,93
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA L = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	1,00	366,70	366,70


 José Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3




VILVAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI


CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00	293,46	586,92
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	1,00	358,31	358,31
5.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	24,00	9,00	216,00
6 ADM LOCAL DA OBRA					
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	12,42	1.242,00
TOTAL					130.500,22

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020


 José Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3





VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL

OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua Luiz Schena

LOCAL: Matos Costa - SC

TOMADA DE PREÇOS 007/2019

BDI...: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.815,28
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.655,64	0,39	645,70
2	DRENAGEM				35.540,03
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	277,53	8,28	2.297,95
2.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	136,67	57,60	7.872,19
2.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,86	86,41	12.171,71
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	222,02	9,00	1.998,18
2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA CONCRETO	UNID	14	800,00	11.200,00
3	PAVIMENTAÇÃO				98.195,61
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.655,64	1,49	2.466,90
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	165,56	100,00	16.556,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	1.655,64	47,82	79.172,70
4	PASSEIOS				58.489,68
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	433,04	33,00	14.290,32
4.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	801,12	3,00	2.403,36
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	801,12	50,00	40.056,00
4.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO				
4.4	ALERTA/DIRECIONAL DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E= 5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)	UNID	6,00	290,00	1.740,00
5	SINALIZAÇÃO				1.635,93
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	1,00	366,70	366,70
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00	293,46	586,92



[Handwritten signature]

Jose Claudio Maciel
Engenheiro Civil
CREA-PB Nº 155657/D
CREA-SC Nº 145805-3


VII^o AR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n^o 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	1,00	358,31	358,31
5.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	36,00	9,00	324,00
6 ADM LOCAL DA OBRA					
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	20,75	2.075,00
TOTAL					197.751,53

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020


 José Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR N^o 155857/D
 CREA-SC N^o 145805-3





VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL

OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua José Antonio Carneiro TR 01

LOCAL: Matos Costa - SC

TOMADA DE PREÇOS 007/2019

BDI...: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.169,58
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	490,64	0,39	191,35
2 DRENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	90,85	8,28	752,24
2.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,50	57,60	316,80
2.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,92	86,41	1.894,11
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	57,79	173,20	10.009,23
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	68,19	9,00	613,71
2.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MÁGICO, REVESTIDA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA CONCRETO	UNID	4	800,00	3.200,00
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	490,64	1,49	731,05
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	49,06	100,00	4.906,00
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	490,64	47,82	23.462,40
4 PASSEIOS					
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,26	33,00	6.608,58
4.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	280,36	3,00	841,08
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	280,36	50,00	14.018,00
4.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO	UNID	4,00	290,00	1.160,00
5 SINALIZAÇÃO					
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA L = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	3,00	366,70	1.100,10



Handwritten signature of José Claudio Maciel

Jose Claudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR Nº 155657/D
 CREA-SC Nº 145805-3

VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E FERRO - LÍMITE EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n° 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	2,00	293,46	586,92
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNID	3,00	358,31	1.074,93
5.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	24,00	9,00	216,00
6	ADM LOCAL DA OBRA				820,00
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	8,20	820,00
TOTAL					73.672,09

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020

[Handwritten Signature]
 José Cláudio Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR N° 155657/D
 CREA-SC N° 145805-3

[Handwritten Signature]



VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

CNPJ: 31.320.555/0001-44

RUA Rafael Drabik, n 281 - Área Industrial - General Carneiro - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL

OBRA: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua José Antonio Carneiro TR 02

LOCAL: Matos Costa - SC

TOMADA DE PREÇOS 007/2019

BDI...: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	389,86	1.226,77
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	146,65	0,39	1.169,58
2	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	146,65	1,49	8.698,32
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO OU PÓ DE PEDRA	M3	14,67	100,00	218,51
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	146,65	47,82	1.467,00
3	PASSEIOS				
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	41,90	33,00	7.012,80
3.1					5.848,66
3.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	73,32	3,00	1.382,70
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	73,32	50,00	219,96
	RAMPA DE ACCESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM LARGURA DE 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E= 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO	UNID	2,00	290,00	3.666,00
3.4	ALERTA/DIRECCIONAL DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E= 5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)				580,00
4	SINALIZAÇÃO				
4.1	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	12,00	9,00	108,00
5	ADM LOCAL DA OBRA				
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	3,57	108,00
					357,00
TOTAL					16.238,76

GENERAL CARNEIRO - PR, 14 DE JANEIRO DE 2.020

José Claudio Maciel
Engenheiro Civil
CREA-PR Nº 155657/D
CREA-SC Nº 145805-3




LAUDO DE TÉCNICO



1 SOLICITANTE

Prefeitura Municipal de Matos Costa – Licitação.

2 OBJETO

Análise técnica dos valores unitários nas planilhas orçamentárias do contrato 33/2019 do processo licitatório 44/2019.

3 QUESTIONAMENTO

Foi apontado pela Agência On-line BADESC, que existe divergência dos valores unitários das planilhas orçamentária apresentada pela empresa **VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI** com sede na rua Rafael Drabik, 281 – Área Industrial, na cidade de General Carneiro/PR, inscrita sobre o CNPJ: 31.320.555/0001-44.

4 PARECER

Conforme parecer da Agência do BADESC,

"Os preços unitários e totais dos serviços que compõem a obra estão de acordo com o orçamento e tabelas referenciais de mercado.

Entretanto considerando como parte de um mesmo lote de licitação os preços unitários dos mesmos serviços devem ser iguais entre si. Dessa forma, os seguintes serviços estão com preços unitários incompatíveis:

- reaterro de vala;
- boca de lobo;
- bloco sextavado;
- meio-fio;
- passeio em piso intertravado;
- pintura acrílica p/ sinalização horizontal;

Assim, solicitamos que os preços destes serviços sejam homogêneos, adotando o menor valor apresentado como o adequado"

foi lavrada a notificação a empresa para realizar a correção dos valores e a apresentação das novas planilhas orçamentárias homogeneizadas, que no dia 17 de janeiro de 2020, apresentou as planilhas que foi verificada e que estão corretas.

Os itens e respectivos valores homogeneizados são:



ITENS	VALOR UNITÁRIO (R\$)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	9,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA CONCRETO	800,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	47,82
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	33,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/ PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	50,00
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	9,00

Os valores totais originais, os novos valores e a supressão são:

Rua	Valor Original	Valor Homo.	Supressão
Olavo Ribas	R\$ 468.123,42	R\$ 468.123,41	R\$ 0,01
Castro Alves	R\$ 135.914,69	R\$ 130.500,22	R\$ 5.414,47
Luiz Schena	R\$ 198.743,46	R\$ 197.751,53	R\$ 991,93
José Antonio Carneiro Trecho 01	R\$ 76.666,67	R\$ 73.672,09	R\$ 2.994,58
José Antonio Carneiro Trecho 02	R\$ 16.925,71	R\$ 16.238,76	R\$ 686,95



Totais	R\$ 896.373,95	R\$ 886.286,01	R\$ 10.087,94
---------------	----------------	----------------	---------------

O valor do contrato original é de R\$ 896.373,95, após a apresentação da planilhas homogeneizadas o valor total é de R\$ 886.286,01, fica suprimido R\$ 10.087,94 do contrato original.

Matos Costa, 20 de janeiro de 2020.

Bruno Regalin
Engenheiro Civil
CREA/SC 164059-2

PARECER JURÍDICO.

ASSUNTO: Solicitação de aditamento do objeto do Pregão Presencial n.º 044/2019.



Trata-se de análise jurídica sobre a possibilidade de aditamento de supressão do objeto do contrato da licitação em epígrafe.

Analisando os autos, constata-se que o pedido de aditamento de supressão de valor do contrato n.º 33/2019 foi devidamente justificado, vez que os valores dos itens são desiguais sem qualquer justificativa plausível e encontra amparo na alínea b do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93, senão vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Entretanto, deve-se salientar que o § 1º menciona uma limitação a esta possibilidade, vejamos:

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (...).

No caso em tela, verifica-se que o presente aditivo de supressão está dentro do limite previsto no § 1º II do Art.65 da Lei 8.666 de 1993.

Destarte, opino pela legalidade do aditivo requerido.

É o parecer.

S.M.J.

Matos Costa, 20 de janeiro de 2020.


Grasielle Barcelos Amaral

OAB/PR 30.357

Procuradora-geral



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA - PMMC**



**1º ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 33/2019
SUPRESSÃO DE VALOR DE SERVIÇOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019**

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, por seu órgão representativo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**, com sede à Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Matos Costa, SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51, neste ato representado, pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. **RAUL RIBAS NETO**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF nº 558.526.379-04, residente e domiciliado nesta cidade de Matos Costa, SC.

CONTRATADA: **VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicílio na Rua Rafael Drabik, 281, Área Industrial, na cidade de General Carneiro, PR, inscrita no CNPJ nº 31.320.555/0001-44, neste ato representado pelo Sr. **VILMAR PEDRO RENNER**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 023.706.609-29, residente e domiciliado na cidade de General Carneiro, PR.

Nos termos do Processo Licitatório nº 44/2019 na modalidade Tomada de Preço nº 07/2019 que originou a contratação, bem como, das normas da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes, firmam o presente Termo aditivo mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente aditivo tem por objeto a supressão de valor de serviços diversos de pavimentação e drenagem, de acordo com o conteúdo das notificações encaminhadas a empresa, laudo técnico de engenharia e parecer jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com o artigo 65, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.

ITENS	VALOR UNITÁRIO (R\$)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	9,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA CONCRETO	800,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	47,82
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	33,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/ PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	50,00
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	9,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA - PMMC



Os valores totais originais, os novos valores e a supressão são:

Rua	Valor Original	Valor Homologado	Supressão
Olavo Ribas	R\$ 468.123,42	R\$ 468.123,41	R\$ 0,01
Castro Alves	R\$ 135.914,69	R\$ 130.500,22	R\$ 5.414,47
Luiz Schena	R\$ 198.743,46	R\$ 197.751,53	R\$ 991,93
José Antonio Carneiro Trecho 01	R\$ 76.666,67	R\$ 73.672,09	R\$ 2.994,58
José Antonio Carneiro Trecho 02	R\$ 16.925,71	R\$ 16.238,76	R\$ 686,95
Totais	R\$ 896.373,95	R\$ 886.286,01	R\$ 10.087,94

CLÁUSULA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste termo aditivo na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Setor de Licitações até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Matos Costa (SC), 20 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
RAUL RIBAS NETO - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

VILMAR RENNER COM. DE ART. DE CIMENTO EIRELI
VILMAR PEDRO RENNER
CONTRATADA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA - PMMC



1º ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 33/2019
SUPRESSÃO DE VALOR DE SERVIÇOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, por seu órgão representativo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**, com sede à Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Matos Costa, SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51, neste ato representado, pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. **RAUL RIBAS NETO**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF nº 558.526.379-04, residente e domiciliado nesta cidade de Matos Costa, SC.

CONTRATADA: **VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicílio na Rua Rafael Drabik, 281, Área Industrial, na cidade de General Carneiro, PR, inscrita no CNPJ nº 31.320.555/0001-44, neste ato representado pelo Sr. **VILMAR PEDRO RENNER**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 023.706.609-29, residente e domiciliado na cidade de General Carneiro, PR.

Nos termos do Processo Licitatório nº 44/2019 na modalidade Tomada de Preço nº 07/2019 que originou a contratação, bem como, das normas da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes, firmam o presente Termo aditivo mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente aditivo tem por objeto a supressão de valor de serviços diversos de pavimentação e drenagem, de acordo com o conteúdo das notificações encaminhadas a empresa, laudo técnico de engenharia e parecer jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com o artigo 65, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.

ITENS	VALOR UNITÁRIO (R\$)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	9,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA CONCRETO	800,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	47,82
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	33,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/ PODOTATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	50,00
PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	9,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA - PMMC**



Os valores totais originais, os novos valores e a supressão são:

Rua	Valor Original	Valor Homologado	Supressão
Olavo Ribas	R\$ 468.123,42	R\$ 468.123,41	R\$ 0,01
Castro Alves	R\$ 135.914,69	R\$ 130.500,22	R\$ 5.414,47
Luiz Schena	R\$ 198.743,46	R\$ 197.751,53	R\$ 991,93
José Antonio Carneiro Trecho 01	R\$ 76.666,67	R\$ 73.672,09	R\$ 2.994,58
José Antonio Carneiro Trecho 02	R\$ 16.925,71	R\$ 16.238,76	R\$ 686,95
Totais	R\$ 896.373,95	R\$ 886.286,01	R\$ 10.087,94

CLÁUSULA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO


A publicação resumida deste termo aditivo na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Setor de Licitações até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Matos Costa (SC), 20 de janeiro de 2020.


MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
RAUL RIBAS NETO - Prefeito Municipal
CONTRATANTE


VILMAR RENNER COM. DE ART. DE CIMENTO EIRELI
VILMAR PEDRO RENNER
CONTRATADA

acordo com o item 10.6 do Edital, e será convocado o candidato imediatamente classificado na seqüência do certame.

A Admissão/Nomeação e a Posse/ Exercício estão vinculados a apresentação prévia de toda a documentação citada no item 2. e subitens do Edital do Concurso Público. A listagem também pode ser retirada no departamento de recursos humanos, dentro do prazo legal.

Matos Costa, 22 de Janeiro de 2020.

RAUL RIBAS NETO
Prefeito Municipal



Publicação Nº 2319434

EXTRATO 1º ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO 33/2019

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

1º ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR NOS SERVIÇOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019 - CONTRATO Nº 33/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

CONTRATADA: VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.320.555/0001-44.

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a supressão de valor de serviços diversos de pavimentação e drenagem, de acordo com o conteúdo das notificações encaminhadas a empresa, laudo técnico de engenharia e parecer jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com o artigo 65, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

VALOR SUPRESSÃO: R\$ 10.087,94 (dez mil oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).
Matos Costa, 20 de janeiro de 2020. Raul Ribas Neto – Prefeito Municipal.

EXTRATO 3º ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO 31/2019

Publicação Nº 2319622

EXTRATO 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 41/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 - CONTRATO Nº 31/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

CONTRATADA: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.289.188/0001-89

PRAZO DE EXECUÇÃO – 05/02/2020 A 05/05/2020.

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução, conforme solicitação da empresa, laudo técnico de engenharia e parecer jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com o artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. Demais informações permanecem alteradas.

Matos Costa, 21 de janeiro de 2020. Raul Ribas Neto – Prefeito Municipal.

EXTRATO 4º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 01/2018

Publicação Nº 2319437

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

EXTRATO 4º ADITIVO VALOR CONTRATUAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 39/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

CONTRATADA: TEMPERO PROPAGANDA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.786.204/0001-28.
VALOR R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

VIGÊNCIA: INICIO: 01/01/2020 TÉRMINO: 04/01/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 3.3.90.39.88.00.00.00 - Despesa 22.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o valor contratual, conforme solicitação da empresa, mediante parecer jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com o artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. Demais informações permanecem inalteradas.

Matos Costa, 01 de janeiro de 2020. Raul Ribas Neto – Prefeito Municipal.



NOTIFICAÇÃO n. 03/2020

NOTIFICANTE: O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137, Centro, Matos Costa, SC, inscrito no CNPJ 83.102.566/0001-51, neste ato representada pela Secretária de administração Sr^a. **CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI**

NOTIFICADA: VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.320.555/0001-44, com sede na cidade de General Carneiro, PR, neste ato representada pela Sr. **VILMAR PEDRO RENNER**, brasileiro, empresário, inscrita no CPF sob nº 023.706.609-29, residente e domiciliada na cidade de General Carneiro, PR.

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: ATO DE FISCALIZAÇÃO- Tomada de Preço nº 07/2019.

Senhor Representante,

Em visita in loco na data de 04 de fevereiro de 2020, na referida obra, o engenheiro fiscal da obra constatou que há necessidade de adequações, sendo estas referenciadas no Ato de Fiscalização Laudo Técnico que segue em anexo, para ciência e providências.

Em virtude do não comparecimento em reunião agendada verbalmente na data 04/02/2020 às 09:00h, Fica Vossa Senhoria, juntamente com o responsável técnico pela execução, **NOTIFICADOS** para comparecerem no setor de Administração, na data de 05/02/2020, às 10:00 horas, sito à Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137, Centro, Matos Costa-SC, para fins de esclarecimentos de projetos e execução.

O não comparecimento implica em encaminhamento à assessoria jurídica para aplicação de multas e ou rescisão contratual.

Matos Costa, SC, 04 de fevereiro de 2020.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Administração

ATO DE FISCALIZAÇÃO - LAUDO TÉCNICO



1 OBJETO

Ato de fiscalização técnica da execução da obra pavimentação em lajota sextavada de trecho das rua Castro Alves, Olavo Ribas, José Antonio Carneiro - TR 01, José Antonio Carneiro - TR 01 e Luiz Schena com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos, **contrato 33/2019 do processo licitatório 44/2019.**

2 FISCALIZAÇÃO

Foi fiscalizada a obra e foi encontrado os seguintes apontamentos:

- a) Apresentação da ART de execução original;
- b) Falta de sinalização das ruas, conforme manual BADESC;
- c) Execução das tubulações de drenagem divergentes dos projetos e memorial descritivo, atentar para item 12.1 e 12.2 do memorial descritivo;
- d) Atentar para NBR 15645, item 4.5.15;
- e) Serviços de topografia não realizados.

3 PARECER

Conforme mostra figuras a baixo, as tubulações não atende as normas específica, como profundidades mínimas, compactação, assentamento, execução das juntas:

Figura 1 - Execução das tubulações, aterro sem compactação.



Figura 2 - Profundidade mínima não atingida.



Figura 3 - Acomodação dos Tubos.



Figura 4 - Falta de compactação, juntas ou material filtrante.



Figura 5 - Tubo danificado e assentamento em desacordo com NBR 15645.



4 CONCLUSÃO

Solicito que a empresa realize os ajustes e adequações respeitando o prazo de execução previsto em cronograma físico contando a partir do dia 20/01/2020, ressaltando que as execuções das demais ruas não estão ocorrendo.

Matos Costa, 04 de fevereiro de 2020.

Bruno Regalin
Engenheiro Civil
CREA/SC 164059-2



ATA nº 001/2020

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, as dez horas, nas dependências da Prefeitura Municipal, reuniram-se o engenheiro do Município Bruno Regalin, Dr^a Grasielle B Amaral, Secretário de Viação Obras e Urbanismo Paulo B Camargo, Secretária de Administração Cleuza M R Tomacheuski, a gestora de projetos Henriete L W Carneiro, o proprietário da empresa Vilmar Pedro Renner e o engenheiro da empresa Jose Claudio Maciel, para tratar de assuntos referente a execução da obra de pavimentação com lajotas nas ruas Olavo Ribas, Castro Alves, Luiz Schena e Jose Antonio Carneiro, objeto do Processo Licitatório 44/2019, TP 07/2019. A empresa recebeu na data de hoje o esboço da alteração do projeto de drenagem da Rua Olavo Ribas. De acordo com a notificação expedida pelo município na data de 04/02/2020, a empresa providenciará imediatamente a entrega da ART original e até o inicio da semana seguinte dia 10/02/2020, as placas de sinalização que estão faltando, bem como, a placa da obra; Que será realizada a colocação de pedra brita no trecho partindo do entroncamento das ruas Tereza Cristina, Manoel Lourenço de Araujo e Olavo Ribas da estaca 220 ate a 340, e nas travessas de escoamento final, no entanto, tal serviço não consta na planilha orçamentária do referido processo licitatório; Que será necessário a remoção de solo mole que foi encontrado no trecho a ser pavimentado, removendo e colocando cascalho e rachão, para o qual a empresa solicitará aditivo; Que os serviços de topografia, estaqueamento da rua e nivelamento tem previsão de inicio para o dia 10/02/2020. Foi discutido ainda, que a Rua Olavo Ribas recebe transito pesado de carretas. Sendo assim, para garantir a durabilidade e qualidade da obra, é necessário colocação de pedra brita e compactação em toda a extensão de transito da rua. A empresa orçará o valor e o município analisará. Os itens acima definidos na reunião deverão ser solicitados pela empresa por escrito ainda na data de hoje dia 05/02/2020, se possível. Nada mais havendo a ser tratado, encerra-se a presente reunião e ata que vai pelos presentes assinada. Matos Costa 5 de fevereiro de 2020.

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



A empresa "VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI", pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro estabelecida na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, á Rua Rafael Drabik, nº 281 - Bairro Área Industrial, inscrita com CNPJ sob nº 31.320.555/0001-44, vem através desta em resposta a notificação sob nº 003/2020, com data de 04 de Fevereiro de 2.020, que os itens solicitados na mesma, conforme reunião realizada em 05 de Fevereiro de 2.020, as 10:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Matos Costa SC, conforme a Ata de reunião 001/2020, os itens da notificação foram debatidos e acordados conforme consta na referida ata, tendo como objetivo a integração e o bom andamento da obra, as solicitações do Município serão atendidas conforme abaixo descritas:

Item 001 - Apresentação da ART de execução Original

A mesma segue em anexo deste documento;

Item 02 - Falta de Sinalização das ruas, conforme manual BADESC

A empresa informou que a sinalização no referido trecho em execução, já existe mais a mesma será complementada e posicionada de acordo com o manual, o mais breve possível;

Item 03 - Execução de tubulações de drenagem divergentes dos projetos e memorial descritivo, atender para item 12.1 e 12.2 memorial descritivo

Conforme reunião junto aos setores competentes do Município, registrado em ata, a execução das tubulações seguiram as orientações sugeridas e determinadas em norma, sendo que alguns trechos têm a necessidade de colocação de um lastro de pedra brita para a base do assentamento da tubulação, tendo a necessidade de um aditivo para a colocação e do material, já que o mesmo não estava contemplado nas planilhas de orçamento;

Item 04 - Atentar a NBR 15645, item 4.5.15


Com relação ao atendimento da NBR acima mencionada, com as medidas adotadas no item anterior, a execução do assentamento da tubulação de drenagem atenderá a referida NBR;

Item 05 - Serviços de topografia não realizados

Quanto aos serviços de topografia, os mesmos serão realizados após a conclusão dos trabalhos de drenagem e conforme acordado na reunião e registrado em ata no mesmo dia.

Tendo em vista o atendimento das solicitações registradas na notificação nº 03/2020, desde já agradece e fica a disposição.

General Carneiro - Pr, 06 de Fevereiro de 2020.



VILMAR RENNER COM DE ARTEF. CIMENTO EIRELI



Recebido
6-2-2020
[Signature]

SOLICITAÇÃO Nº 001/2020



ASSUNTO: Aditivo de valor do Processo Licitatório sob n. 044/2019 - Tomada de Preços nº 007/2019 - conforme descrições abaixo:

A empresa "**VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**", pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro estabelecida na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, á Rua Rafael Drabik, nº 281 - Bairro Área Industrial, inscrita com CNPJ sob nº 31.320.555/0001-44.

OBJETO: Pavimentação em lajotas sextavadas.

O referido aditivo de valor tem por objetivo a Rua Olavo Ribas, com extensão de 427,85 Metros de comprimento, 11,00 Metros de pista de rolamento e 2,00 Metros de passeio para cada lado.

Conforme deciso em reunião ocorrida na data de 05 de Fevereiro de 2.020, com o Setor de Engenharia, Secretaria de Obras e Jurídico do Município de Matos Costa - SC, de acordo com alterações no projeto inicial, para execução dos itens abaixo a empresa apresenta e solicitada o referido aditivo de valores do contrato, para estar cumprindo com o que foi acordado e determina as normas, serviços e materiais estes não contemplados em planilhas orçamentárias da obra em questão:

Item 01 - Colocação de um lastro de pedra brita com as dimensões descritas, para servir de base para o assentamento da tubulação de drenagem.

TRECHO 01 - TUBULAÇÃO

COMPRIMENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
53,95	X	0,70	X	0,05	1,89 M ³

TRECHO 02 - TUBULAÇÃO

COMPRIMENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
85,00	X	0,70	X	0,05	2,98 M ³

Conforme cálculo acima se tem um total de material a ser utilizado nos trechos identificados de: **4,87 M³**.

Item 02 - Remoção, transporte e compactação com a função de efetuar reforço de base, conforme orientação e solicitação do Engenheiro do Município, no trecho das estacas 220 a 340, com largura de 2,70 Metros e com profundidade média de 1,50 Metros.

Observação: O material a ser utilizado neste reforço de base, será todo ele fornecido pelo Município de Matos Costa - SC, ficando somente a contratada em efetuar o carregamento, transporte, remoção e compactação.



REFORÇO DE BASE 01

COMPRIMENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
120,00	X	2,70	X	1,50	486,00 M ³

Item 03 - Lastro de bica corrida em toda a via de rolamento da Rua Olavo Ribas, num total de 427,85 Metros de comprimento, 11,00 Metros de largura e com altura do referido lastro de 0,05 cm.

REFORÇO DE BASE 02

COMPRIMENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
427,85	X	11,00	X	0,05	235,32 M ³

Tendo em vista e com base em dados levantados juntamente com o Setor de Engenharia do Município, Secretaria de Obras e demais Secretarias envolvidas, os itens acima têm a necessidade do referido aditivo para que a obra em si tenha a durabilidade necessária e a qualidade.

Itens estes não previstos em planilhas orçamentos, sendo elas necessárias e identificadas com a movimentação do solo da referida via.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom center of the page.

RELATÓRIO COM VALORES E QUANTIDADES


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	Trecho 01 - Lastro com pedra brita para base de tubulação	4,87 M3	110,00	535,70
002	Serviços de remoção, transporte, compactação e carregamento de material para reforço de base (Observação: Inclui transporte e carregamento do material da pedreira).	486,00 M3	12,00	5.832,00
003	Lastro de pedra bica corrida em toda a via de rolamento da Rua Olavo Ribas, com as dimensões acima	235,32 M3	110,00	25.885,20
VALOR TOTAL				32.252,90




General Carneiro - PR, 06 de Fevereiro de 2.020



VILMAR RENNER COM DE ARTEF. CIMENTO EIRELI

Recebido
6-2-2020


Assunto Fwd: DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES AO ENGENHEIRO BRUNO E AO SETOR JURÍDICO
De <projetos@matoscosta.sc.gov.br>
Para Engenharia <engenharia@matoscosta.sc.gov.br>, licita <licita@matoscosta.sc.gov.br>, juridico <juridico@matoscosta.sc.gov.br>
Cópia prefeitura <prefeitura@matoscosta.sc.gov.br>
Data 2020-02-12 13:55
Prioridade Alta



3º aditivo.

- pedido aditivo e oficio vilmar renner.pdf (~12 MB)

----- Mensagem original -----

Assunto: DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES AO ENGENHEIRO BRUNO E AO SETOR JURÍDICO
Data: 2020-02-12 10:24
De: Evolução Assessoria Contábil <evolucaocontabil@live.com>
Para: "projetos@matoscosta.sc.gov.br" <projetos@matoscosta.sc.gov.br>



DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES AO ENGENHEIRO BRUNO E AO SETOR JURÍDICO

ATT;



Evolução
Assessoria
Contábil

Alex Jekel

Sócio-Administrador

☎ 42 3552-1213 || 42 3552-2675
42 98800-7299

📍 escevolucao.com.br

📍 Av. Presidente Getúlio Vargas, 36
General Carneiro - PR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ENGENHARIA E SETOR DE OBRAS



ASSUNTO: Processo Licitatório sob n. 044/2019 - Tomada de Preços nº 007/2019 - conforme descrições abaixo:

A empresa "VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI", pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro estabelecida na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, á Rua Rafael Drabik, nº 281 - Bairro Área Industrial, inscrita com CNPJ sob nº 31.320.555/0001-44, vem solicitar aos Setores envolvidos no objeto deste processo licitatório, que após iniciar os trabalhos de drenagem nas vias abaixo descritas:

ITEM	DESCRIÇÃO
001	Rua Luiz Schena
002	Rua Castro Alves
003	Rua José Antonio Carneiro
004	Rua Olavo Ribas

Tem a necessidade de efetuar o reforço de sub-base nas extensões de cada via, após inicio dos projetos de drenagem teve conhecimento necessário para ver que o terreno em questão tem uma camada superficial de solo firme, mais após uma determinada profundidade o solo não tem resistência esperada para estar recebendo as cargas que ali estariam previstas com tráfego de veículos leves e pesados, podendo em curto período da existência do pavimento apresentar deformações pela falta de resistência do solo em questão.

Com as imagens em anexo e visitas in loco, pelos setores envolvidos no projeto, solicitamos para que se efetuem as coletas e ensaios de resistência dos solos em questão, para que possam ser tomadas as medidas necessárias para alcançar as resistências desejadas.


Aproveitando a referida solicitação, pedimos para uma análise mais detalhada da Rua Olavo Ribas, com relação às estacas 220 a 340, já que após orientação e solicitação dos

Setores de Engenharia e Obras do Município, a mesma esta recebendo um reforço de sub-base no sentido lado esquerdo da via, mais precisamente ao lado dos terrenos onde não se encontram benfeitorias, pode-se notar que no lado oposto onde se encontra as residências mais precisamente a frente delas, a empresa executora do projeto em si, solicita que também seja efetuada a coleta e ensaio do solo para que se necessário for estar recebendo o referido reforço de sub-base para não haver comprometimento com relação ao projeto.

Com relação ao andamento da obra de modo geral, com estes imprevistos identificados na sua execução com relação às vias que iram receber todo sistema de pavimentação e passeio, as mesmas terão sua execução atrasadas, tanto pela execução dos itens não contemplados nas planilhas orçamentárias quanto pelo prazo dos estudos dos solos das vias que tem como objetivo receber o pavimento em questão ao projeto.

Desde já agradecemos sua atenção, certos de sua compreensão e podermos contar seu entendimento dos fatos.

General Carneiro – Pr. 07 de Fevereiro de 2.020.



VILMAR RENNER COM DE ARTEF. CIMENTO EIRELI



SOLICITAÇÃO Nº 002/2020



ASSUNTO: Aditivo de valor do Processo Licitatório sob n. 044/2019 - Tomada de Preços nº 007/2019 - conforme descrições abaixo:

A empresa "**VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**", pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro estabelecida na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, á Rua Rafael Drabik, nº 281 - Bairro Área Industrial, inscrita com CNPJ sob nº 31.320.555/0001-44.

OBJETO: Pavimentação em lajotas sextavadas.

O referido aditivo de valor tem por objetivo as seguintes vias:

ITEM	RUA / VIA	METROS	DESCRIÇÃO
001	Rua Luiz Schena	277,53 M	Lastro de pedra brita para assentamento de tubulação
002	Rua Castro Alves	213,86 M	Lastro de pedra brita para assentamento de tubulação
003	Rua José Antonio Carneiro	90,85 M	Lastro de pedra brita para assentamento de tubulação

Após iniciados os serviços de drenagem nas vias acima mencionadas, segue em anexo algumas imagens de trechos com suas valas já abertas e prontas estar recebendo a tubulação, tendo em vista que o solo para o assentamento não se encontra em condições com o que a norma que estabelece a maneira correta para o assentamento. A execução deste trabalho necessita a colocação de pedra brita formando um lastro para o assentamento da tubulação, além de que consta em projeto uma cobertura com pedra brita e nas suas laterais de toda a tubulação, tendo em vista que o material não consta nas planilhas orçamentárias.



TRECHO 01 - TUBULAÇÃO LASTRO PARA A BASE - RUA LUIZ SCHENA

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
277,53	X	0,80	X	0,05	11,10 M ³

TRECHO 01 - TUBULAÇÃO COBERTURA - RUA LUIZ SCHENA

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
277,53	X	0,80	X	0,05	11,10 M ³

TRECHO 01 - TUBULAÇÃO DOS LADOS - RUA LUIZ SCHENA

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
277,53	X	0,10	X	1,00	27,75 M ³

TRECHO 02 - TUBULAÇÃO PARA A BASE - RUA CASTRO ALVES

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
213,86	X	0,80	X	0,05	8,55 M ³

TRECHO 02 - TUBULAÇÃO COBERTURA - RUA CASTRO ALVES

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
213,86	X	0,80	X	0,05	8,55 M ³

TRECHO 02 - TUBULAÇÃO DOS LADOS - RUA CASTRO ALVES

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
213,86	X	0,10	X	1,00	21,39 M ³

TRECHO 03 - TUBULAÇÃO - RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
90,85	X	0,80	X	0,05	3,63 M ³

TRECHO 02 - TUBULAÇÃO COBERTURA - RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
90,85	X	0,80	X	0,05	3,63 M ³

TRECHO 02 - TUBULAÇÃO DOS LADOS - RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO

COMPRI-MENTO	X	LARGURA	X	ALTURA	TOTAL M ³
90,85	X	0,10	X	1,00	9,09 M ³




Conforme cálculos acima têm um total de material a ser utilizado nos trechos identificados de: **104,79 M³**.

Itens estes não previstos em planilhas orçamentárias, sendo elas necessárias e identificadas com a movimentação do solo das referidas vias.

RELATÓRIO COM VALORES E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	Lastro com pedra brita para base de tubulação	104,79 M ³	110,00	11.526,90
VALOR TOTAL				11.526,90

General Carneiro - PR, 07 de Fevereiro de 2.020



VILMAR RENNEN COM DE ARTEF. CIMENTO EIRELI





ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
492
SANTA CATARINA






Escavação
efetuada
07/02/2020.

Pode-se
notar que
tem a
necessidade
do lastro de
pedra brita

Nesta imagem podemos
perceber que a camada é
pequena com relação ao
solo adequado para o
assentamento da
tubulação e pavimento,
ficando claro que tem a
necessidade do reforço
de base na via de
pavimento também.





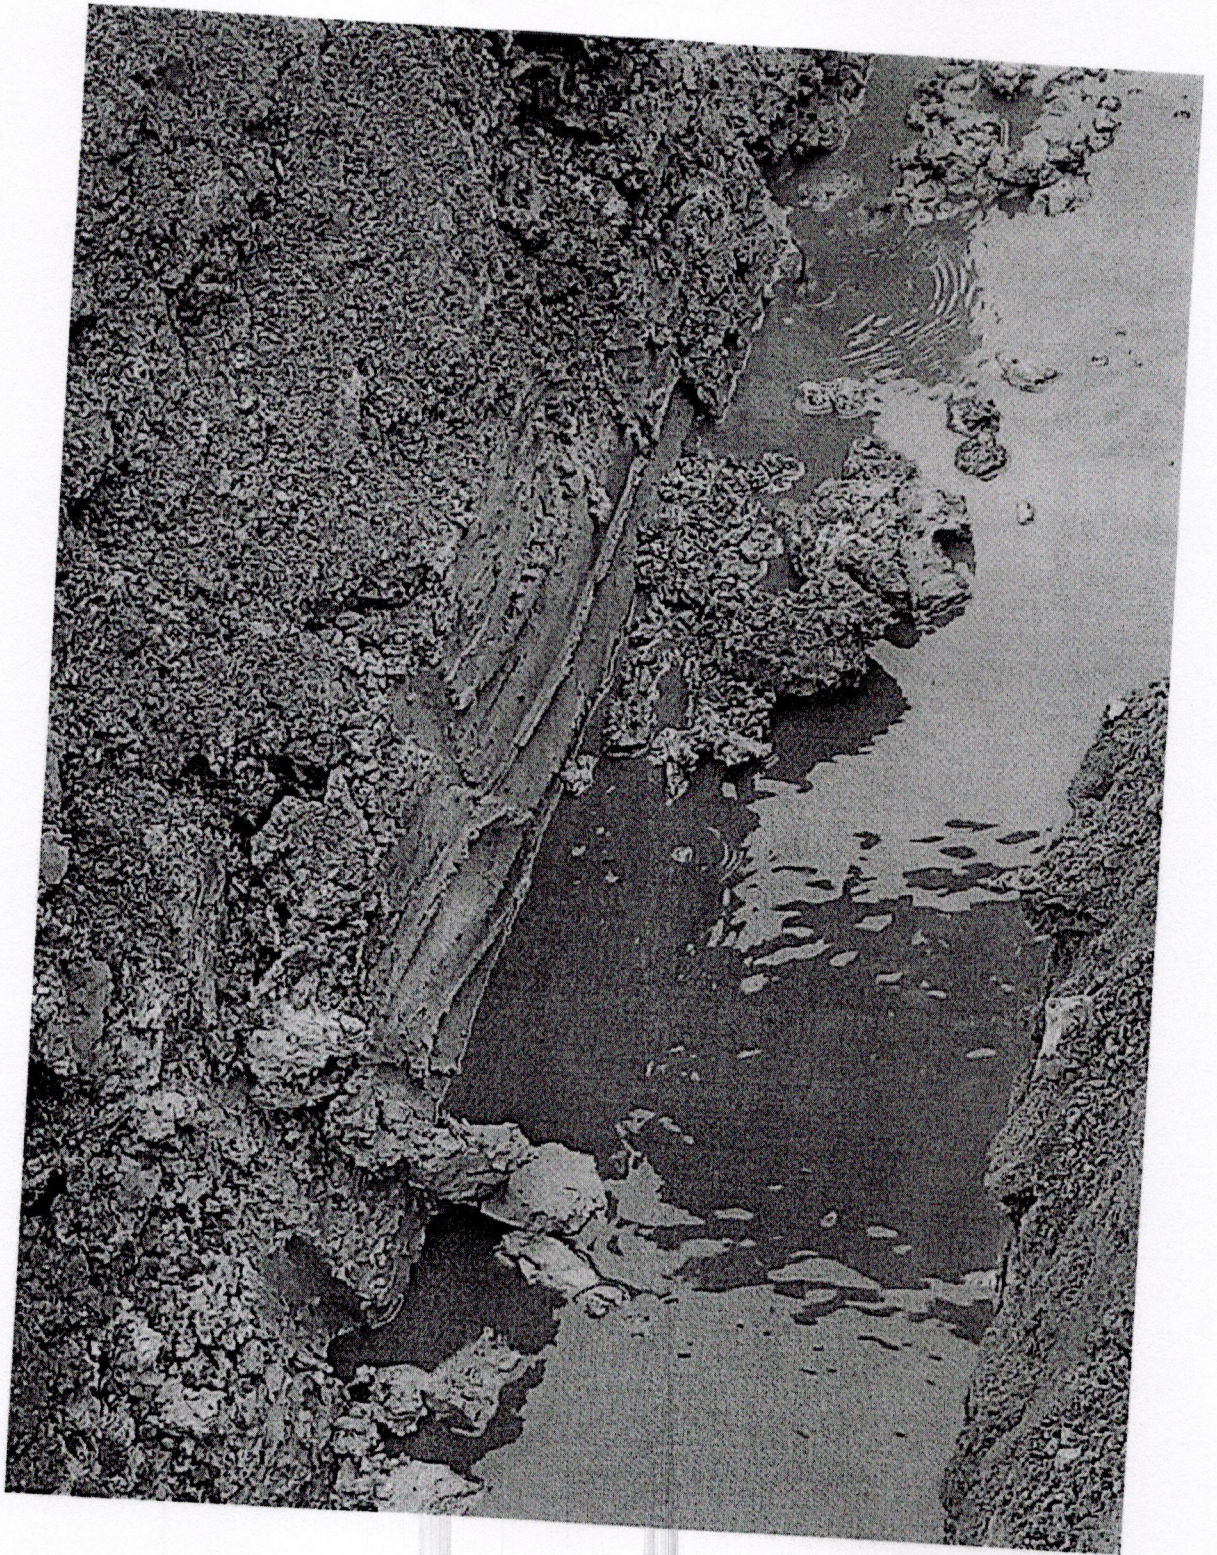



406
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
SANTA CATARINA



VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
RUA RAFAEL DRABIK Nº 281 - AREA INDUSTRIAL
GENERAL CARNEIRO - PARANÁ - CEP: 84.660-000
CNPJ Nº 31.320.555/0001-44



NOTIFICAÇÃO Nº 001/2020

Em virtude dos diversos ajustes no referido projeto de drenagem e pavimentação feitas pelo Setor de Obras e Engenharia do Município de Matos Costa - SC, com relação ao Processo Licitatório sob n. 044/2019 - Tomada de Preços nº 007/2019, onde os referidos ajustes para execução não constavam em planilhas orçamentárias, foi feita as solicitações de Aditivo para dar a continuidade da obra, conforme notificação emitida pelo Município, sob nº 03/2020 com data de 04 de Fevereiro de 2020, solicitando os referidos ajustes no projeto, a empresa efetuou os quantitativos dos materiais a serem utilizados para a seqüência do projeto de drenagem, sendo primeiro aditivo sob nº 001/2020 e o segundo aditivo sob nº 002/2020, ambos os protocolos com aproximadamente 15 (Quinze) dias, e ainda não obtivemos as respostas dos mesmos, atrasando totalmente o andamento da obra, além de estar com equipamentos e material totalmente parados para o andamento da obra, gerando prejuízos diariamente.

Tendo em vista que após iniciar a escavação para a drenagem, foi observado tanto pela empresa quanto pelo Engenheiro e o Setor de Obras do Município, que deveria ser efetuado um estudo ou sondagem dos trechos onde apresentaram os problemas para o andamento da obra, sendo que após o resultado dos testes e ensaios do solo, seriam determinados os tipos de trabalhos e materiais a serem utilizados para garantir a estabilidade e resistência do solo.

Solicitamos também que as mudanças no referido projeto sejam entregues a empresa para que possamos nos resguardar quanto a estes fatos já que alteração o projeto original, ficando difícil de executar a obra como prevê o referido projeto com tantos ajustes e mudanças no decorrer e andamento da obra, salientamos que também estamos solicitando um aditivo de prazo de execução quanto a estes imprevistos constatados e verificados nos referidos trechos.

Por estes motivos e pelo prazo curto de execução dos trechos ora contratados, a empresa toma como por necessidade notificar e comunicar que a mesma esta fazendo o que e possível para que a referida obra tenha um ótimo andamento e que não continue a

VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
RUA RAFAEL DRABIK Nº 281 - AREA INDUSTRIAL
GENERAL CARNEIRO - PARANÁ - CEP: 84.660-000
CNPJ Nº 31.320.555/0001-44

empresa arcando com os prejuízos e demais despesas por mudanças de projeto não previstas e liberação de aditivos quanto aos itens que não constam em planilhas orçamentárias.

Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já agradecemos a compreensão.

General Carneiro - PR, 20 de Fevereiro de 2.020.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vilmar Renner", written over a horizontal line.

Vilmar Renner Com. De Art. De Cimento EIRELI

Recebido
20-2-2020
Handwritten initials or a mark, possibly "RW", written below the date.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
MATOS COSTA - SANTA CATARINA



Ofício GP/RRN nº 045/2020.


Matos Costa, 2 de março de 2020

Prezado Senhor

Com meus cumprimentos, vimos pelo presente em atenção a notificação 01/2020 da Empresa Vilmar Renner Comércio de Artefatos de Cimento Eirerli, encaminhar em anexo resposta emitida pelo setor de engenharia do Município de Matos Costa.

Sendo o que se apresenta.

Atenciosamente


Cleuza Mª Redolfi Tomacheuski
Secretária de Administração

Ilmo Senhor

Vilmar Pedro Renner

Responsável da Empresa Vilmar Renner Comércio de Artefatos de Cimento Eirerli
General Carneiro - PR

*Recebido
03/03/2020
José Carlos Moura*



LAUDO TÉCNICO

1 OBJETO

Resposta da notificação nº 01/2020 da empresa VILMAR RENNER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, CNPJ 31.320.555/0001-44 da obra pavimentação em lajota sextavada de trecho das rua Castro Alves, Olavo Ribas, José Antonio Carneiro - TR 01, José Antonio Carneiro - TR 01 e Luiz Schena com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos, **contrato 33/2019 do processo licitatório 44/2019.**

2 PARECER

2.1 PONTOS LEVANTADOS PELA EMPRESA

Em notificação emitida pela empresa foram levantados os seguintes pontos:

- a) Ajustes no projeto de drenagem
- b) Referidos ajustes para a execução não constavam em planilhas orçamentárias;
- c) Quantitativos dos materiais a serem utilizados para a seqüência do projeto de drenagem, não respondidos;
- d) Entrega dos projetos de drenagem com as alterações;
- e) Aditivo de prazo de execução;
- f) Prejuízos e demais despesas por mudanças de projeto.

2.2 ANÁLISE E RESPOSTA

2.2.1 AJUSTES NO PROJETO DE DRNAGEM

Os projetos de drenagem foram corretamente dimensionados pelos engenheiros da AMARP (Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe), os ajustes previsto foram decorrente a impossibilidade da execução conforme o projeto por interferências naturais não previsíveis encontrada na obra, como é comum nesse tipo de obra, quando se trata de uma região onde se tenha muita rocha e solo argiloso, esses ajustes após concluídos será passados para a AMARP para realização do projeto de "As-

Built", caso seja conveniente a empresa pode solicitar que o engenheiro da AMARP responsável pelo projeto esteja marcando uma visita para esclarecimento.

2.2.2 REFERIDOS AJUSTES PARA A EXECUÇÃO NÃO CONSTAVAM EM PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

Os ajustes em geral não interferem na do orçamento da obra, todo e qualquer serviços vá ser executado a mais do que a quantidade previsto deverá ser indicada pela empresa e será analisados pelo setor Jurídico e pelo setor de Obras e Engenharia, podendo ser encaminhando ainda a AMARP para avaliação do engenheiro responsável pelo projeto.

As Alterações que está sendo alegadas, na verdade já estavam previstas em projeto, memorial e normas conforme edital que a empresa por sua vez negligenciou e/ou não apontou.

2.2.3 QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA A SEQÜÊNCIA DO PROJETO DE DRENAGEM, NÃO RESPONDIDOS

Os aditivos foram recebidos e verificados, ficando apenas a medição *in-loco* para a confirmação das extensões dos trechos, só não liberado até o momento pelo fato das drenagem apresentar problemas de execução e por estarmos aguardando o laudo de ensaio do solo, conforme foi combinado em reunião.

2.2.4 ENTREGA DOS PROJETOS DE DRENAGEM COM AS ALTERAÇÕES

Os projetos de drenagem serão elaborados após o termino da execução, projeto conhecido com "as-built", para resguardo de empresa deverá ser levantadas fotos dos serviços executados e diários de obra, sendo que, as drenagem poderão facilmente ser medidos em obras, já que são lineares, essas medições lineares serão feitas para se realizar o pagamento das drenagem, toda drenagem suprimida será levantada *in-loco*.



2.2.5 ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

A empresa está dentro do prazo de execução de 120 dias, o aditivo de prazo deverá ser solicitado nos últimos 30 dias, com vigência de mais 30 dias sendo justificados, ou se for comprovado a necessidade de prazo maior poderá ser concedido.

2.2.6 PREJUÍZOS E DEMAIS DESPESAS POR MUDANÇAS DE PROJETO

Se a empresa está tendo prejuízo é em virtude de retrabalhos que estão sendo feitos em razão das notificações, não sendo responsabilidade da prefeitura, que preza pelo serviço de qualidade como o prestado a qualquer outra empresa privada, podendo ser contestados os serviços executados.

Volto a salientar que a empresa negligencia as boas praticas e documentações, que ao compor o valor de BDI, riscos operacionais devem ser considerados, caso a empresa não tenha considerado não é de responsabilidade da prefeitura.

2.3 CONCLUSÃO

Por fim concluo que há varias frentes na obra a serem executadas e serviços a serem feitos que não estão, não sendo motivos para a paralisação, fica a vista evidenciado descaso do serviço.

Aproveito para reiterar a negligencia da empresa quanto a documentação e peço para que se atente ao **Item 1 do Memorial Descritivo**,

" [...]Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMMC e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser semanal (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 2 horas semanais sempre no mesmo horário."

Matos Costa, 28 de fevereiro de 2020.

Bruno Regalin
Engenheiro Civil
CREA/SC 164059-2
